

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött

### egyrésztől a megrendelő (továbbiakban Megrendelő):

Megrendelő neve: **Vasvár Város Önkormányzata**  
Székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.  
Teljes jogú képviselője: Tóth Balázs polgármester  
Adószám: 15733816-2-18  
Telefon/fax: (94) 572 012

### másrésztől a vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó):

Vállalkozó neve: VVHC Konzorcium  
Konzorcium címe: 9800 Vasvár, Petőfi Sándor u. 25.

Konzorciumvezető: Varga és Varga Építőipari Kft.  
Székhelye: 9800 Vasvár, Petőfi Sándor u. 25.  
Teljes jogú képviselője: Varga István ügyvezető  
Cégjegyzék szám: 18-09-102791  
Adószám: 11317290-2-18  
Számlaszám: 12099007-01206145-00100006  
Számlavezető pénzügyintézet: Raiffeisen Bank Zrt.  
Kapcsolattartó: Varga István ügyvezető  
Telefon: 94/573-157  
E-mail: info@vargaut.hu  
Részesedés értéke: 36,5 %

Konzorciumi tag neve: HYDROCOMP KFT.  
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.  
Teljes jogú képviselője: Barabás Miklós ügyvezető  
Cégjegyzék szám: 20-09-061410  
Adószám: 11344304-2-20  
Számlaszám: 10104961-08530100-01003005  
Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt.  
Kapcsolattartó: Barabás Miklós  
Telefon: 92/550-680  
Telefax: 92/550-689  
E-mail: hydrocomp@hydrocomp.hu  
Részesedés értéke: 63,5 %

mint szerződő felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### Előzmény:

Megrendelő „Útfelújítási munkák ellátása Vasvár Város Önkormányzata részére” címen közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLI. évi törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ alapján, az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására, amelynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.

## 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az előzményben szereplő építési beruházás jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, és Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés alapján, I. osztályú minőségben történő teljeskörű megvalósítását.

Az építőipari kivitelezői feladatok elvégzésének helyszíne:

Vasvár Város Önkormányzata kezelésében álló alábbi útszakaszok

- József Attila u., 560 hrsz.
- Vasúti út, 448 hrsz.
- Hármashegy I. u., 769/2, 794/2, 876 hrsz.
- Hármashegy III. u., 884/2 hrsz.
- Hármashegy III. u., 3662 hrsz.
- Csokonai u., 1113 hrsz.
- Vörösmarty u., 1624 hrsz.
- Névtelen u., 1630 hrsz.
- Pásztor u., 424, 425 hrsz.
- Névtelen út /Nagymákfa/, 4488 hrsz.
- Hunyadi János u., 1872/2 hrsz.
- Bartók Béla út, 1955 hrsz.
- Petőfi Sándor u., 545 hrsz.
- Névtelen út, 1980 hrsz.
- Németh Antal u., 988 hrsz.:

A beruházás műszaki tartalmát meghatározzák:

- a) jelen szerződés előzményében megjelölt közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja (tervek, műszaki leírások) és árazatlan költségvetés
- b) valamint Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott beárazott költségvetése, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

## 2. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÖSSZEGE

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítéséért Nettó vállalási ár:

44.700.000 Ft + 27% áfa azaz nettó negyvennégymillió-hétszázezer forint + 27% áfa vállalkozói díj illeti meg.

2.1. Fenti összeg rögzített egységáron, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.

2.2. Megrendelő ez úton nyilatkozik, hogy jelen szerződésben szereplő munkák nem tartoznak a

fordított ÁFA hatálya alá.

### 3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

Az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésének határideje:

Munkaterület átadásának határideje: jelen szerződés aláírásával egyidejűleg

Kivitelezési feladatok ellátása legkésőbb: 2017. szeptember 30-ig, előtejesítés lehetséges

### 4. MŰSZAKI FELTÉTELEK

4.1. Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.

4.2. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről

Név: Schmolczer Imre műszaki ellenőr  
Cím: 9700 Szombathely, Komlósi Ferenc u. 7.  
Tel/Fax: 06-30-620-5585  
E-mail: [smolczer.imre@gmail.com](mailto:smolczer.imre@gmail.com)

Név: Varga Zoltán műszaki osztályvezető  
Cím: 9800 Vasvár, Alkotmány u.1.  
Tel/Fax: 06-30-620-2501  
E-mail: [varga.zoltan@vasvar.hu](mailto:varga.zoltan@vasvar.hu)

Vállalkozó részéről

Név: Varga Szabolcs  
Cím: 9800 Vasvár, Petőfi Sándor .25.  
Tel/Fax: 06-30-9861-530  
E-mail: [info@vargaut.hu](mailto:info@vargaut.hu)

Név: Barabás Miklós  
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.  
Tel/Fax: 92/550-680  
E-mail: [hydrocomp@hydrocomp.hu](mailto:hydrocomp@hydrocomp.hu)

4.3. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

4.4. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

- 4.5. A Megrendelő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg átadni a hatályos törvényeknek valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő kiviteli terveket egy nyomtatott példányban illetve egy elektronikus formában (CD adathordozó).
- 4.6. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. A kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételi lehetőséget a Megrendelő biztosítja, de annak költsége Vállalkozót terheli.  
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.  
A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.
- 4.7. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.  
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.  
Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.  
A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.
- 4.8. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési Naplóban rögzíteni.  
Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni.
- 4.9. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
- 4.10. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
- 4.11. Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.
- 4.12. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból a szerződést módosíthatja, a Kbt. 132.§-ban foglaltak figyelembevételével.
- 4.13. Pótmunka csak írásbeli szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végezhető. Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat alapját képező tervekben és engedélyekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Felek megállapodnak, hogy

pótmunkát csak és kizárólag Megrendelő és írásban rendelhet el. Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja.

- 4.14. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégzetése, a termék minősítése. Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók.
- 4.15. Vállalkozó az alábbi Alvállalkozót (Alvállalkozókat) jogosult bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett: -
- 4.16. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégzetteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.
- 4.17. A munka minőségének meghatározására jelen szerződés előzményében meghatározott közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.
- 4.18. Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégzetteti.
- 4.19. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 8 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról napi bontású műszaki ütemtervet és forgalomkorlátozási tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.
- 4.20. Vállalkozó köteles a tényleges munkakezdést megelőzően Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT), valamint Technológiai Utasítást (TU) készíteni és átadni Megrendelőnek jóváhagyásra. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, silt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemet és silt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.
- 4.21. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.

- 4.22. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségvállalás mellett felel.
- 4.23. Vállalkozó feladata az üzembe helyezés engedélyeztetése a Szolgáltatónál, amelynek felmerülő költségei is (adott esetben) Vállalkozót terhelik.

## 5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- 5.1. A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint – a Kbt. 135. §-ával összhangban – a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással.
- 5.2. Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
- a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
  - b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
  - c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
  - d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
  - e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
- 5.3. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
- 5.4. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egyenmű és lejárt követelését számíthatja be.
- 5.5. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
- 5.6. A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől

számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

- 5.7. A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készen jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
- 5.8. Előleg biztosítása:  
Figyelemmel a Kbt. 135.§ (7) bekezdésben foglaltakra Megrendelő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja Vállalkozó részére.  
Az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.
- 5.9. Részszámla biztosítása:  
Megrendelő 2 részszámla és a vég számla benyújtását teszi lehetővé, az alábbiak szerint.
- 1. részszámla: az ajánlati ár 35%-ának megfelelő műszaki tartalom teljesítése esetén;
  - 2. részszámla: az ajánlati ár 70%-ának megfelelő műszaki tartalom teljesítése esetén;
  - vég számla: a szerződésben foglalt valamennyi műszaki tartalom teljesítése esetén.
- A műszaki tartalom és az ahhoz kapcsolódó ellenszolgáltatási érték megállapítására Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott árazott költségvetés az irányadó.
- A számlák kiállítására ajánlattevő az előírt műszaki tartalomnak műszaki ellenőr által történt leigazolt teljesítését követően jogosult.
- 5.10. A számla (vég számla) kiállítására ajánlattevő a teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr által történt leigazolt teljesítését követően jogosult.
- 5.11. A 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó számlák befogadására a Vállalkozónak történő kifizetés előtt 30 nappal nem régebbi együttes adóigazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére, vagy szerepelnie kell a NAV köztartozásmentes adatbázisában.
- 5.12. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat, amennyiben azt Megrendelő elrendeli, a vég számlával együtt – az előző pontban ismertetett módon – köteles kifizetni. A Vállalkozó a pótmunka elszámolása során nem alkalmazhat magasabb díjtételeket, és anyagárakat, mint amelyeket az árajánlatában megadott. Vállalkozó köteles a pótmunkák díját Megrendelővel előzetesen egyeztetni.
- 5.13. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§-ban foglaltak szerint köteles késedelmi kamatot megfizetni Vállalkozó részére.
- 5.14. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni.
- 5.15. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő, azaz 223.500 Ft napi kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek. A kötbér a Megrendelő általi kiértesítés alapján érvényesíthető. A késedelmi kötbér felső határa a vállalkozói díj 20%-a, azaz 8.940.000 Ft.

- 5.16. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.
- 5.17. Meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 30 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben Vállalkozó a jelen pontban megjelölt mértékű meghiúsulási kötbért köteles vállalni.
- 5.18. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

## 6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.
- 6.2. A vállalkozó készre jelentése alapján megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belüli időpontra tűzi ki az átadás-átvételi eljárás megkezdését.
- 6.3. Az átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 30 nap.
- 6.4. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.
- 6.5. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele.
- 6.6. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
- 6.7. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 6.8. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

## 7. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

- 7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.



- 7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.
- 7.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 48 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet, illetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
- 7.4. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a 48 hónapos vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni.

## 8. KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

- 8.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.
- 8.2. Szerződő Felek a szerződés alapidokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkozó Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.
- 8.3. Szerződő Felek a 8.2. pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal együtt érvényes.
1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
  2. számú melléklet: Konzorciumi szerződés

## 9. KÖZBESZERZÉSI ZÁRADÉK

- 9.1. Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján előírja Szállító (nyertes ajánlattevő) részére:
- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
  - b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
- 9.2. Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha



- a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

## 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 10.1. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., a Kbt., a 191/2009 Korm. rendelet valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 10.2. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes Szombathelyi Járásbíróság és a Szombathelyi Törvényszék jár el.
- 10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Vasvár, 2017. május 17.



A handwritten signature of Varga István is shown above a horizontal line. Below the line, the text reads: "Varga István ügyvezető Vállalkozó".

**VARGA ÉS VARGA**  
Építőipari Kft.  
Vasvár, Petőfi S. u. 25.  
Adószám: 11317290-2-18




1.

Mellékletek:

Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során becsatolt tételes költségvetése – 1. számú melléklet  
Konzorciumi szerződés – 2. számú melléklet

Költségvetési főösszesítő  
Úthelyreállítási munkálatok kivitelezése - Vis maior

	A:	D:
1. József Attila u., 560 hrsz.	8 600 Ft	5 730 Ft
2. Vasúti út, 448 hrsz.	300 800 Ft	506 700 Ft
3. Hármashegy I. u., 769/2, 794/2, 876 hrsz.	2 705 400 Ft	3 963 710 Ft
4.-5. Hármashegy III. u., 884/2 hrsz., 3662 hrsz.	533 300 Ft	1 048 380 Ft
6. Csokonai u., 1113 hrsz.	1 868 800 Ft	3 501 920 Ft
7.-8. Vörösmarty u., 1624 hrsz., névtelen út 1630 hrsz.	1 174 900 Ft	1 876 850 Ft
9. Pásztor u., 424, 425 hrsz.	1 761 000 Ft	2 716 080 Ft
10. Névtelen út/Nagymákfa/, 4488 hrsz.	845 900 Ft	1 561 850 Ft
11. Hunyadi u., 1872/2 hrsz.	4 005 300 Ft	5 755 370 Ft
12. Bartók Béla út, 1955 hrsz.	973 100 Ft	1 813 670 Ft
13. Petőfi Sándor u., 545 hrsz.	1 154 000 Ft	1 058 840 Ft
14. Névtelen út, 1980 hrsz.	1 972 000 Ft	3 442 000 Ft
15. Németh Antal u., 988 hrsz.	46 800 Ft	99 000 Ft
<b>Anyag összesen:</b>	<b>17 349 900 Ft</b>	
<b>Díj összesen:</b>		<b>27 350 100 Ft</b>
<b>Anyag+díj összesen:</b>	<b>44 700 000 Ft</b>	
<b>Áfa 27%:</b>	<b>12 069 000 Ft</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>56 769 000 Ft</b>	

   22

Költségvetés  
Úthelyreállítási munkálatok kivitelezése - Vls maior

			a:	d:	A:	D:
1.	József Attila u., 560 hrsz.					
1.1	Padka készítése 0/11 bazaltból átlag 7,5 cm vastagságban 0,8 m szélességben /12x0,8x0,075=21,25/	1	m3	8 600 Ft	5 730 Ft	8 600 Ft 5 730 Ft
<b>Anyag összesen:</b>					<b>8 600 Ft</b>	
<b>Díj összesen:</b>						<b>5 730 Ft</b>
2.	Vasúti út, 448 hrsz.					
2.1	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földszállítás 2 km-en belül	8	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft 31 200 Ft
2.2	Meglévő padka profilozása gépi erővel, hengerléssel/75x1=75/	75	m2	0 Ft	900 Ft	0 Ft 67 500 Ft
2.3	Szórt alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 10 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /75x1=75x0,1=7,5/	8	m3	9 100 Ft	14 500 Ft	72 800 Ft 116 000 Ft
2.4	Padka készítése AC-11 jelű aszfaltból átlag 5 cm vastagságban 1,0 m szélességben /75x1,0x0,05=3,75/	4	m3	57 000 Ft	73 000 Ft	228 000 Ft 292 000 Ft
<b>Anyag összesen:</b>					<b>300 800 Ft</b>	
<b>Díj összesen:</b>						<b>506 700 Ft</b>
3.	Hármashegy I. u., 769/2, 794/2, 876 hrsz.					
3.1	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földszállítás 2 km-en belül	77	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft 300 300 Ft
3.2	Meglévő út profilozása gépi erővel, hengerléssel/160x3,5+65x2,5+25x2,0=772,5/	773	m2	0 Ft	570 Ft	0 Ft 440 610 Ft
3.3	Szórt alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 20 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /160x3,5x0,2+65x2,5x0,15+25x2,0x0,15=143,875 m3/	144	m3	9 100 Ft	12 300 Ft	1 310 400 Ft 1 771 200 Ft
3.4	Szórt alap készítése VSZ 0/11 bazalttal átlag 5cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /772,5x0,05=38,625 m3/	39	m3	8 600 Ft	14 600 Ft	335 400 Ft 569 400 Ft
3.5	Kétrétegű felületi bevonat készítése KZ 8/11 alsó, és KZ 4/8 felső zúzalék felhasználásával /160x3,5=560/	560	m2	1 560 Ft	940 Ft	873 600 Ft 526 400 Ft
3.6	Padka készítése helyi anyagból 10 cm vastagságban 0,3-0,3 m szélességben /(160+65+25) x0,6x0,1=15 m3/	15	m3	2 600 Ft	5 500 Ft	39 000 Ft 82 500 Ft
3.7	Csapadékvíz elvezető árok készítése/tisztítása átlag 0,4 m3/m kitermelt földmennyiséggel, szállítással /150x0,4=60/	60	m3	0 Ft	1 930 Ft	0 Ft 115 800 Ft
3.8	Csőáteresz beépítése /Ø 40 cm/ előfejekkel két helyre /7 fm/	7	fm	21 000 Ft	22 500 Ft	147 000 Ft 157 500 Ft
<b>Anyag összesen:</b>					<b>2 705 400 Ft</b>	
<b>Díj összesen:</b>						<b>3 963 710 Ft</b>

23

4.-5.	Hármashegy III. u., 884/2 hrsz., 3662 hrsz.						
4.-5.1	Teljes pályaszerkezet készítése bazalttal átlag 40 cm vastagságban, bitumenes fedéssel	45	m2	5 800 Ft	6 760 Ft	261 000 Ft	304 200 Ft
4.-5.2	Padka készítése 0/11 bazaltból átlag 10-15 cm vastagságban, pontszerűen /140x0,125=17,5/	18	m3	8 600 Ft	5 500 Ft	154 800 Ft	99 000 Ft
4.-5.3	Csapadékvíz elvezető árok készítése/tisztítása átlag 0,4 m3/m kitermelt földmennyiséggel, szállítással /690x0,4=276/	276	m3	0 Ft	1 930 Ft	0 Ft	532 680 Ft
4.-5.4	Burkolt árok helyreállítása	25	m2	4 700 Ft	4 500 Ft	117 500 Ft	112 500 Ft
<b>Anyag összesen:</b>						<b>533 300 Ft</b>	
<b>Díj összesen:</b>							<b>1 048 380 Ft</b>
6.	Csokonai u., 1113 hrsz.						
6.1	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földelszállítás 2 km-en belül	16	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft	62 400 Ft
6.2	Meglévő út profilozása gépi erővel, hengerléssel/160x5=800/	800	m2	0 Ft	900 Ft	0 Ft	720 000 Ft
6.3	Szórt alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 20 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /160x5,0x0,2=160/	160	m3	9 100 Ft	12 300 Ft	1 456 000 Ft	1 968 000 Ft
6.4	Szórt alap készítése VSZ 0/11 bazalttal átlag 5cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /160x5,0x0,05=40/	40	m3	8 600 Ft	14 600 Ft	344 000 Ft	584 000 Ft
6.5	Padka készítése 0/11 bazaltból átlag 5 cm vastagságban 0,5-0,5 m szélességben /160x1,0x0,05=8/	8	m3	8 600 Ft	5 500 Ft	68 800 Ft	44 000 Ft
6.6	Csapadékvíz elvezető árok készítése/tisztítása átlag 0,4 m3/m kitermelt földmennyiséggel, szállítással /160x0,4=64/	64	m3	0 Ft	1 930 Ft	0 Ft	123 520 Ft
<b>Anyag összesen:</b>						<b>1 868 800 Ft</b>	
<b>Díj összesen:</b>							<b>3 501 920 Ft</b>
7.-8.	Vörösmarty u., 1624 hrsz., névtelen út 1630 hrsz.						
7.-8.1	Burkolt árok és padka javítás	70	m2	4 700 Ft	4 500 Ft	329 000 Ft	315 000 Ft
7.-8.2	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földelszállítás 2 km-en belül	38	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft	148 200 Ft
7.-8.3	Meglévő út profilozása gépi erővel, hengerléssel/150x2,5=375/	375	m2	0 Ft	570 Ft	0 Ft	213 750 Ft
7.-8.4	Szórt alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 20 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /150x2,5x0,2=104/	75	m3	9 100 Ft	12 300 Ft	682 500 Ft	922 500 Ft
7.-8.5	Szórt alap készítése VSZ 0/11 bazalttal átlag 5cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /150x2,5x0,05=18,75/	19	m3	8 600 Ft	14 600 Ft	163 400 Ft	277 400 Ft
<b>Anyag összesen:</b>						<b>1 174 900 Ft</b>	
<b>Díj összesen:</b>							<b>1 876 850 Ft</b>

24

9.	Pásztor u., 424, 425 hrsz.								
9.1	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földszállítás 2 km-en belül	54	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft	210 600 Ft		
9.2	Meglévő út profilozása gépi erővel, hengerléssel/140x2,5+95x2,0=540/	540	m2	0 Ft	570 Ft	0 Ft	307 800 Ft		
9.3	Szórt alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 20 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /140x2,5x0,2=70/	70	m3	9 100 Ft	12 300 Ft	637 000 Ft	861 000 Ft		
9.4	Szórt alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 15 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /95x2,0x0,2=38/	38	m3	9 100 Ft	13 300 Ft	345 800 Ft	505 400 Ft		
9.5	Szórt alap készítése VSZ 0/11 bazalttal átlag 5cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /(140x2,5+95x2,0)x0,05=26/	27	m3	8 600 Ft	14 600 Ft	232 200 Ft	394 200 Ft		
9.6	Kétrétegű felületi bevonat készítése KZ 8/11 alsó, és KZ 4/8 felső zúzalék felhasználásával /140x2,5=350/	350	m2	1 560 Ft	940 Ft	546 000 Ft	329 000 Ft		
9.7	Csapadékvíz elvezető árok készítése/tisztítása átlag 0,4 m3/m kitermelt földmennyiséggel, szállítással /140x0,4=56/	56	m3	0 Ft	1 930 Ft	0 Ft	108 080 Ft		
<b>Anyag összesen:</b>						<b>1 761 000 Ft</b>			
<b>Díj összesen:</b>							<b>2 716 080 Ft</b>		
10.	Névtelen út/Nagymákfa/, 4488 hrsz.								
10.1	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földszállítás 2 km-en belül	38	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft	148 200 Ft		
10.2	Meglévő út profilozása gépi erővel, hengerléssel/150x2,5=375/	375	m2	0 Ft	570 Ft	0 Ft	213 750 Ft		
10.3	Szórt alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 20 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /150x2,5x0,2=75/	75	m3	9 100 Ft	12 300 Ft	682 500 Ft	922 500 Ft		
10.4	Szórt alap készítése VSZ 0/11 bazalttal átlag 5cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /150x2,5x0,05=18,75/	19	m3	8 600 Ft	14 600 Ft	163 400 Ft	277 400 Ft		
<b>Anyag összesen:</b>						<b>845 900 Ft</b>			
<b>Díj összesen:</b>							<b>1 561 850 Ft</b>		
11.	Hunyadi u., 1872/2 hrsz.								
11.1	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földszállítás 2 km-en belül	104	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft	405 600 Ft		
11.2	Meglévő út profilozása gépi erővel, hengerléssel/230x4,5=1035/	1035	m2	0 Ft	570 Ft	0 Ft	589 950 Ft		
11.3	Szórt alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 20 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /230x4,5x0,2=104/	207	m3	9 100 Ft	12 300 Ft	1 883 700 Ft	2 546 100 Ft		
11.4	Szórt alap készítése VSZ 0/11 bazalttal átlag 5cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /230x4,5x0,05=51,75/	52	m3	8 600 Ft	14 600 Ft	447 200 Ft	759 200 Ft		
11.5	Kétrétegű felületi bevonat készítése KZ 8/11 alsó, és KZ 4/8 felső zúzalék felhasználásával /230x4,5=1035/	1035	m2	1 560 Ft	940 Ft	1 614 600 Ft	972 900 Ft		
11.6	Padka készítése helyi anyagból 10 cm vastagságban 0,5-0,5 m szélességben /230x1,0x0,1=23/	23	m3	2 600 Ft	5 500 Ft	59 800 Ft	126 500 Ft		
11.7	Csapadékvíz elvezető árok készítése/tisztítása átlag 0,4 m3/m kitermelt földmennyiséggel, szállítással /230x2x0,4=184/	184	m3	0 Ft	1 930 Ft	0 Ft	355 120 Ft		
<b>Anyag összesen:</b>						<b>4 005 300 Ft</b>			
<b>Díj összesen:</b>							<b>5 755 370 Ft</b>		

12.	Bartók Béla út, 1955 hrsz.								
12.1	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földszállítás 2 km-en belül	38	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft	148 200 Ft		
12.2	Meglévő út profilozása gépi erővel, hengerléssel/105x2,5+45x2,5=375/	375	m2	0 Ft	570 Ft	0 Ft	213 750 Ft		
12.3	Szört alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 20 cm v.-ban, finiszerrel bedolg. /375x0,2=75/	75	m3	9 100 Ft	12 300 Ft	682 500 Ft	922 500 Ft		
12.4	Szört alap készítése VSZ 0/11 bazalttal átlag 5cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /375x0,05=18,75/	19	m3	8 600 Ft	14 600 Ft	163 400 Ft	277 400 Ft		
12.5	Padka készítése helyi anyagból 10 cm vastagságban 0,5-0,5 m szélességben /(105+55+45)x0,1=20,5/	21	m3	2 600 Ft	5 500 Ft	54 600 Ft	115 500 Ft		
12.6	Cölöpölt, farönkös, kavicsolt járda felújítása 30 m hosszon	30	m	2 420 Ft	3 000 Ft	72 600 Ft	90 000 Ft		
12.7	Csapadékvíz elvezető árok készítése/tisztítása átlag 0,4 m3/m kitermelt földmennyiséggel, szállítással /60x0,4=24/	24	m3	0 Ft	1 930 Ft	0 Ft	46 320 Ft		
Anyag összesen:							973 100 Ft		
Díj összesen:								1 813 670 Ft	
13.	Petőfi Sándor u., 545 hrsz.								
13.1	Csapadékvíz elvezető átereszt feltárása átlag 0,8 m3/m kitermelt földmennyiséggel, szállítással /35x0,8=28/	28	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft	109 200 Ft		
13.2	Csőátereszt beépítése / $\emptyset$ 40 cm/ 35 m hosszon, 1m mélyen	35	fm	19 600 Ft	23 600 Ft	686 000 Ft	826 000 Ft		
13.3	Akna készítése $\emptyset$ 100 cm	4	db	117 000 Ft	30 910 Ft	468 000 Ft	123 640 Ft		
Anyag összesen:							1 154 000 Ft		
Díj összesen:								1 058 840 Ft	
14.	Névtelen út, 1980 hrsz.								
14.1	Tereprendezés, földkitermelés változó vastagságban, földszállítás 2 km-en belül	80	m3	0 Ft	3 900 Ft	0 Ft	312 000 Ft		
14.2	Meglévő út profilozása gépi erővel, hengerléssel/320x2,5=800/	800	m2	0 Ft	570 Ft	0 Ft	456 000 Ft		
14.3	Szört alap készítése VSZ 25/40 bazalttal átlag 20 cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /320x2,5x0,2=160/	160	m3	9 100 Ft	12 300 Ft	1 456 000 Ft	1 968 000 Ft		
14.4	Szört alap készítése VSZ 0/11 bazalttal átlag 5cm vastagságban, finiszerrel bedolgozva /320x2,5x0,05=40/	40	m3	8 600 Ft	14 600 Ft	344 000 Ft	584 000 Ft		
14.5	Padka készítése 0/11 bazaltból átlag 10 cm vastagságban 0,3-0,3 m szélességben /320x0,6x0,1=19,2/	20	m3	8 600 Ft	6 100 Ft	172 000 Ft	122 000 Ft		
Anyag összesen:							1 972 000 Ft		
Díj összesen:								3 442 000 Ft	
15.	Németh Antal u., 988 hrsz.								
15.1	Padka készítése helyi anyagból 10 cm vastagságban 0,8 m szélességben /220x0,8x0,1=17,6/	18	m3	2 600 Ft	5 500 Ft	46 800 Ft	99 000 Ft		
Anyag összesen:							46 800 Ft		
Díj összesen:								99 000 Ft	

## KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

### 1. Konzorciumban résztvevő Felek neve és székhelye:

Név: Varga és Varga Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 9800 Vasvár, Petőfi Sándor utca 25.  
Adószám: 11317290-2-18  
Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-102791  
Bankszámlaszám: 12099007-01206145-00100006  
Képviselő: Varga István ügyvezető/képviselő  
Továbbiakban: Konzorcium Vezető Tag

Név: HYDROCOMP Mélyépítő Kft.  
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.  
Adószám: 11344304-2-20  
Cégjegyzékszám: Cg. 20-09-061410  
Bankszámlaszám: 10104961-08530100-01003005  
Képviselő: Barabás Miklós ügyvezető  
Továbbiakban: Konzorciumi Tag

### 2. Konzorcium neve, címe:

Konzorcium neve: **VVHC Konzorcium**  
Konzorcium címe: **9800 Vasvár, Petőfi Sándor utca 25.**

### 3. A Konzorciumi szerződés célja

A Konzorciumi Tagok kijelentik, hogy a Vasvár Város Önkormányzata (székhely: 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.) Ajánlatkérő) által az „Útfelújítási munkák ellátása Vasvár Város Önkormányzata részére” (az eljárás azonosítója: HKT-032/2017) címmel kiírt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 35. §-ában foglaltakra tekintettel közös ajánlattevőként kívánnak részt venni, és közös ajánlatot kívánnak benyújtani.

Jelen Konzorciumi Szerződést a Konzorcium tagjai (továbbiakban Tagok/Felek) abból a célból kötik, hogy azt a közbeszerzési eljárásban a dokumentációban foglaltaknak megfelelően az Ajánlatuk részeként benyújtsák, és nyertes (közös) ajánlattevőként az Ajánlatkérő által kiválasztásra kerüljenek, valamint a tender megnyerése esetén, a tárgyi vállalkozási szerződést megkössék és ezen vállalkozási szerződés szerinti munká(ka)t a szerződés szerint elvégezzék, szerződéses kötelezettségeiknek teljes mértékben eleget tegyenek.

A **VVHC Konzorcium** a Felek által a Projekt megvalósítására létrehozott olyan alkalmi céltársulás, amelynek közös vagyona, a Felektől elkülönült, önálló jogi személyisége, jogképessége nincsen.

### 4. A szerződés érvényessége

A Szerződés a jelen megállapodásban meghatározott cél elérésének idejére jön létre, és a Felek általi aláírással azonnal hatályba lép. A Szerződés érvényessége illetve hatályának beállta vagy annak megszűnése, teljesítése, alkalmazhatósága és végrehajthatósága nem függ valamely további (felfüggesztő, hatályba léptető, vagy bontó) feltételtől, vagy időponttól, hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatóság általi jóváhagyástól.



### **5. A Konzorcium képvisellete, és képviselőjének feladatai:**

A Felek megállapodnak abban, hogy a Konzorcium képviselétére, a Konzorciumi tagok nevében joghatályos nyilatkozat tételére, illetve a Konzorciumi tagok nevében aláírásra – mint szervezet – a **Varga és Varga Építőipari Kft.** illetve – mint személy – annak törvényes képviselője, **Varga István ügyvezető/cégjegyzésre jogosult képviselő** (a továbbiakban: a „Képviselő”) jogosult a Konzorcium, mint közös ajánlattevők nyertessége esetén, minden további meghatalmazás és/vagy írásos dokumentum nélkül, jelen Konzorciumi Szerződés hatálya alatt. A **Varga és Varga Építőipari Kft.** képviselőjének aláírási mintája jelen Szerződés mellékletét képezi.

A **Varga és Varga Építőipari Kft.** fenti képviseleti és nyilatkozattételi jogát a Felek a jelen megállapodás aláírásával igazolják, ennek megfelelően jelen aláírt Szerződés egyben **Varga és Varga Építőipari Kft.**, illetve annak vezető tisztségviselője, **Varga István ügyvezető/cégjegyzésre jogosult képviselő** meghatalmazása is.

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önállóan - egyedül

**Varga István** jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a Konzorcium képviselétét, illetve a személyét illető felhatalmazást a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint elfogadja.

Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása kizárólag a Konzorcium által az ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Az Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a Konzorcium által megjelölt kapcsolattartónak küldik meg.

Képviselő, a Konzorciumot - a Tagok előzetes hozzájárulásának megfelelően - kizárólagosan képviseli és a Konzorcium nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, illetve a Konzorcium nevében aláírásra, így az ajánlat aláírására, szignálására is jogosult. A Feleket, így a Konzorciumot, jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos teljes körű hatáskörrel, a Képviselő, azaz a **Varga és Varga Építőipari Kft.** vezető tisztségviselője, kizárólagosan képviseli az ajánlatkérővel szemben.

Képviselő jogosult a 3. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok megtételére – a szerződés aláírásának kivételével.

A Képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés Tagok (közös ajánlattevők) általi végrehajtásáért.

### **6. Felelősség**

Tagok kijelentik, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők kiválasztásra kerülnek, egyetemleges teljesítési kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

### **7. Számlák benyújtása**

A Képviselő jogosult számlát benyújtani a szerződő fél számára, (a Konzorciumi Tag az általa végzett tevékenység után a Képviselőnek nyújtja be számlákat, aki azt közvetített szolgáltatásként számlázza tovább a szerződő fél felé).

**8. A Konzorcium feladatainak megosztása, és a szerződéses árból való részesedésük mértéke**

**Varga és Varga Építőipari Kft.**

Feladata: az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatok 36,5 %-a, a szerződéses árból való részesedésének mértéke ennek megfelelően 36,5 %.

A Varga és Varga Építőipari Kft. által elvégzendő feladatok:

- VSZ 0/11 szórt alap készítése finiserrel
- ároktisztítás
- kétrétegű felületi bevonat készítése
- padkakészítés
- árokburkolatok javítása

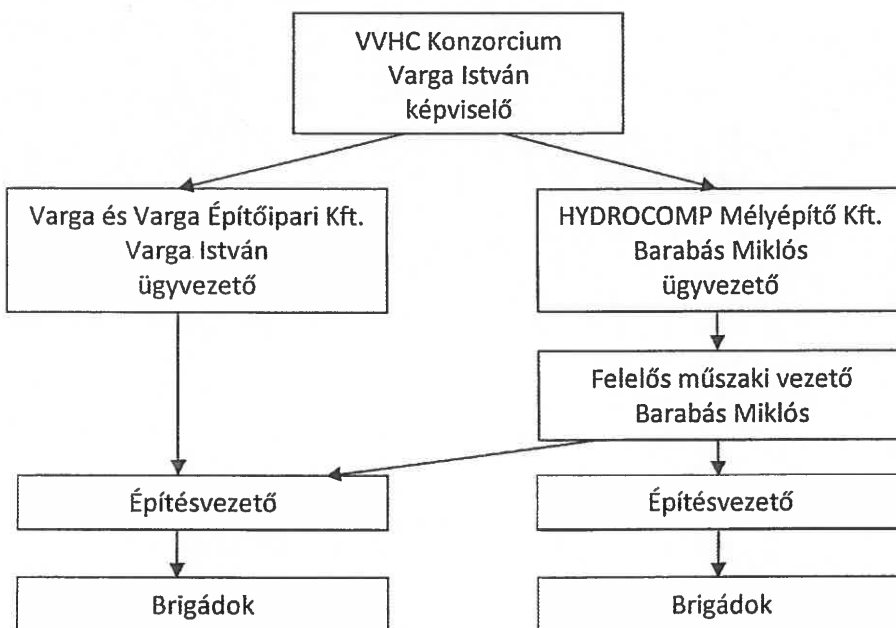
**HYDROCOMP Mélyépítő Kft.**

Feladata: az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatok 63,5 %-a, a szerződéses árból való részesedésének mértéke ennek megfelelően 63,5 %.

A HYDROCOMP Mélyépítő Kft. által elvégzendő feladatok:

- utak profilozása
- VSZ 25/40 szórt alap készítése
- áttereszek építése
- felelős műszaki vezető biztosítása
- aknák építése

A projektszervezet felépítése:



A szerződésben vállalt valamennyi kötelezettséget, a fent rögzítettek kivételével, felek együttesen teljesítik jelen pontban meghatározott részesedési mértékeknek megfelelő hányadban.

A tendényerés esetén az előírt felelősségbiztosítást a vezető tag köti meg, ezek költségeit a tagok jelen pontban rögzített részesedési arányaiknak megfelelő mértékben viselik.

Tendényerés esetén a konzorcium tagjai a 8. pontban rögzített részesedési arányaiknak megfelelő mértékben nyújtják a szükséges biztosítékokat.

*[Handwritten signatures and initials]*

### 9. Egyéb megállapodások

Felek tisztában vannak a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan és szerződésszerű teljesítéséhez elengedhetetlen fokozott együttműködési kötelezettséggel, a folyamatos kapcsolattartás szükségességével, melynek teljesítésére kötelezettséget vállalnak. Ennek keretében kötelezik magukat a megállapodás teljesítéséhez szükséges bármely nyilatkozat vagy cselekmény haladéktalan megtételére. Az együttműködési kötelezettséget megszegő fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

Felek megállapodnak, hogy bármelyik Tag ellen indult felszámolási eljárás esetén a Képviselő ezt a tényt 5 munkanapon belül bejelenti a Vevőnek, és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső Tag nélkül is teljesítik, illetőleg a Tag kiesése mennyiben hátráltatja a teljesítést.

A felek kijelentik, hogy az ajánlat teljes tartalmát annak benyújtását megelőzően megismerték, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A jelen megállapodást a Felek elolvasták, a benne foglaltakat és annak jogkövetkezményeit értelmezték, megértették és magukra nézve elfogadták.

A Konzorciumi Tagok kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 3. pontban meghatározott cél elérése folyamán a tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, és erre érintett alkalmazottaiknak is utasítást adnak.


A Konzorciumi Tagok megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő vitás ügyeket békés úton rendezik. A békés rendezés sikertelensége esetén értékhatártól és hatáskortól függően kikötik a Szombathelyi Járásbíróság vagy a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét. A Konzorciumi Tagok között felmerülő jogviták esetén a hatályos jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.


Elovasás és értelmezés után a Konzorciumi Tagok jóváhagyásuk jeléül aláírásukkal látták el ezt a megállapodást.

Jelen megállapodás a felek aláírásával lép hatályba.

Vasvár, 2017. április 21.

A Meghatalmazott képviselő aláírása:

  
.....  
Konzorcium Vezető Tag  
**VARGA ÉS VARGA**  
Építőipari Kft.  
Vasvár, Petőfi S. u. 25.  
Adószám: 11317290-2-18  
1.

  
.....  
(aláírás) **VARGA ÉS VARGA**  
Építőipari Kft.  
Vasvár, Petőfi S. u. 25.  
Adószám: 11317290-2-18  
1.

